

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										10ª MEDIÇÃO - PERÍODO 12/11/2025 à 11/12/2025								
CONTRATADA: GSF TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI																		
DATA BASE: OUTUBRO/2023 - TABELAS DER/ES;SICRO;SINAPI - VALOR LICITADO: R\$ 4.855.174,49 - VALOR CONTRATADO: R\$ 3.200.000,00 - COEFICIENTE DE DESCONTO: 0,65909 -																		
OBRA: Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação dos Loteamentos Monte Negro e Ernesto Silva pertencentes ao Município de João Neiva-ES										LS:	BDI:	23,32%	PRIMEIRO REPLANILHAMENTO		R\$ 103.942,68	R\$ 3.753.872,98	R\$ 216.515,09	94,547%
										CONTRATO + ADITIVO		10ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO		EXECUTADO
Item	Código	Órgão	DESCRIÇÃO SERVIÇO	Unid.	V. Unit.	V. Total	Quant.	V. Total	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO				
01																		
CANTEIRO DE OBRAS																		
1.1	41498	DER-ES (Rodovias)	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção	m2	R\$ 822,31	R\$ 32.892,40	40,00	R\$ 32.892,40	R\$ -	40,00	R\$ 32.892,40	-	R\$ -	100,00%				
1.2	41528	DER-ES (Rodovias)	Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina	m2	R\$ 287,20	R\$ 7.180,00	25,00	R\$ 7.180,00	R\$ -	25,00	R\$ 7.180,00	-	R\$ -	100,00%				
1.3	41501	DER-ES (Rodovias)	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	m	R\$ 49,38	R\$ 1.234,50	25,00	R\$ 1.234,50	R\$ -	25,00	R\$ 1.234,50	-	R\$ -	100,00%				
1.4	41499	DER-ES (Rodovias)	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	m	R\$ 355,98	R\$ 8.899,50	25,00	R\$ 8.899,50	R\$ -	25,00	R\$ 8.899,50	-	R\$ -	100,00%				
1.5	41503	DER-ES (Rodovias)	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	m	R\$ 531,66	R\$ 10.633,20	20,00	R\$ 10.633,20	R\$ -	20,00	R\$ 10.633,20	-	R\$ -	100,00%				
1.6	41527	DER-ES (Rodovias)	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	und	R\$ 2.786,77	R\$ 2.786,77	1,00	R\$ 2.786,77	R\$ -	1,00	R\$ 2.786,77	-	R\$ -	100,00%				
1.7		COMP-01	Administração Local incluído Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	mês	R\$ 15.390,58	R\$ 184.686,96	12,00	R\$ 184.686,96	1,00	R\$ 15.390,58	12,00	R\$ 184.686,96	-	R\$ -	100,00%			
						SUB-TOTAL 01	R\$ 248.313,33	R\$ 248.313,33	R\$ 15.390,58	R\$ 248.313,33	R\$ -	R\$ -	100,00%					
02																		
SERVIÇOS PRELIMINARES																		
2.1	41500	DER-ES (Rodovias)	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	m²	R\$ 287,43	R\$ 5.173,74	18,00	R\$ 5.173,74	R\$ -	18,00	R\$ 5.173,74	-	R\$ -	100,00%				
2.2	41359	DER-ES (Rodovias)	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras	m	R\$ 27,34	R\$ 54.674,20	1.999,79	R\$ 54.674,20	R\$ -	1.999,79	R\$ 54.674,21	-	R\$ -	100,00%				
						SUB-TOTAL 02	R\$ 59.847,94	R\$ 59.847,94	R\$ -	-	R\$ 59.847,95	-	R\$ -	100,00%				
03																		
DRENAGEM																		
3.1	42960	DER-ES (Rodovias)	Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas	m³	R\$ 7,14	R\$ 15.392,26	2.730,65	R\$ 19.496,86	R\$ -	2.730,65	R\$ 19.496,87	-	R\$ -	100,00%				
3.2	43056	DER-ES (Rodovias)	Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas	m³	R\$ 50,07	R\$ 97.711,26	2.238,93	R\$ 112.103,24	R\$ -	2.238,93	R\$ 112.103,24	-	R\$ -	100,00%				
3.3	60010	DER-ES (Rodovias)	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (2,282XP + 3,043XR + 3,804) (XP=3,1km; XR=0,8km)	t	R\$ 4,19	R\$ 1.981,79	4.744,13	R\$ 19.877,92	R\$ -	4.744,13	R\$ 19.877,93	-	R\$ -	100,00%				
3.4	804023	SICRO	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	R\$ 377,46	R\$ 77.907,74	206,40	R\$ 77.907,74	R\$ -	180,28	R\$ 68.048,50	26,12	R\$ 9.859,26	87,34%				
3.5	804015	SICRO	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	R\$ 230,90	R\$ 281.894,27	1.220,85	R\$ 281.894,27	R\$ -	1.187,85	R\$ 274.274,56	33,00	R\$ 7.619,70	97,30%				
3.6	42751	DER-ES (Rodovias)	Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	m	R\$ 110,03	R\$ 2.014,65	274,81	R\$ 30.237,35	R\$ -	274,81	R\$ 30.237,35	-	R\$ -	100,00%				
3.7	42749	DER-ES (Rodovias)	Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	m	R\$ 82,80	R\$ 21.238,20	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!				
3.8	43046	DER-ES (Rodovias)	Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas	und	R\$ 1.685,90	R\$ 59.006,50	35,00	R\$ 59.006,50	R\$ -	34,00	R\$ 57.320,60	1,00	R\$ 1.685,90	97,14%				
3.9	43047	DER-ES (Rodovias)	Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas	und	R\$ 2.128,34	R\$ 19.155,06	9,00	R\$ 19.155,06	R\$ -	7,00	R\$ 14.898,38	2,00	R\$ 4.256,68	77,78%				
3.10		COMP-02	Trincheira drenante em concreto armado, incluindo grelhas articuladas FOFO, escavação e reaterro	m	R\$ 1.033,45	R\$ 79.647,99	77,07	R\$ 79.647,99	R\$ -	77,07	R\$ 79.647,99	-	R\$ -	100,00%				



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100350039003300380037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										10ª MEDIÇÃO - PERÍODO 12/11/2025 à 11/12/2025								
CONTRATADA: GSF TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI																		
DATA BASE: OUTUBRO/2023 - TABELAS DER/ES;SICRO;SINAPI - VALOR LICITADO: R\$ 4.855.174,49 - VALOR CONTRATADO: R\$ 3.200.000,00 - COEFICIENTE DE DESCONTO: 0,65909 -																		
OBRA: Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação dos Loteamentos Monte Negro e Ernesto Silva pertencentes ao Município de João Neiva-ES										LS:	BDI:	23,32%	PRIMEIRO REPLANILHAMENTO		R\$ 103.942,68	R\$ 3.753.872,98	R\$ 216.515,09	94,547%
										CONTRATO + ADITIVO		10ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO		EXECUTADO
Item	Código	Órgão	DESCRIÇÃO SERVIÇO	Unid.	V. Unit.	V. Total	Quant.	V. Total	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO				
3.11	41241	DER-ES (Rodovias)	Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas	und	R\$ 1.482,81	R\$ 84.520,17	57,00	R\$ 84.520,17		R\$ -	57,00	R\$ 84.520,17	-	R\$ -	100,00%			
3.12	40327	DER-ES (Rodovias)	Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transportes das madeiras	m²	R\$ 229,50	R\$ 124.122,78	685,06	R\$ 157.222,19		R\$ -	685,06	R\$ 157.222,19	-	R\$ -	100,00%			
3.13		COMP-04	Boca projetada em concreto armado	und	R\$ 729,06	R\$ 729,06	1,00	R\$ 729,06		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 729,06	0,00%			
3.14	2003411	SICRO	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais	m	R\$ 503,66	R\$ 23.047,48	45,76	R\$ 23.047,48		R\$ -	-	R\$ -	45,76	R\$ 23.047,48	0,00%			
3.15	2003453	SICRO	Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais	und	R\$ 1.031,88	R\$ 1.031,88	1,00	R\$ 1.031,88		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.031,88	0,00%			
						SUB-TOTAL - 03	R\$ 889.401,09	R\$ 965.877,71		R\$ -	R\$ 917.647,78		R\$ 48.229,96	95,01%				
04			PAVIMENTAÇÃO															
4.1	40891	DER-ES (Rodovias)	Remoção de pavimentação poliédrica	m²	R\$ 7,42	R\$ 37.048,43	4.993,05	R\$ 37.048,43		R\$ -	4.993,05	R\$ 37.048,43	-	R\$ -	100,00%			
4.2	40230	DER-ES (Rodovias)	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	m³	R\$ 1,49	R\$ 6.244,98	4.191,26	R\$ 6.244,98		R\$ -	4.191,26	R\$ 6.244,98	-	R\$ -	100,00%			
4.3	4011209	SICRO	Regularização do subleito	m²	R\$ 0,30	R\$ 3.143,45	10.478,15	R\$ 3.143,45		R\$ -	10.478,15	R\$ 3.143,44	-	R\$ -	100,00%			
4.4	42507	DER-ES (Rodovias)	Remoção de meio fio em Vias Urbanas	m	R\$ 9,98	R\$ 9.978,94	3.332,98	R\$ 33.263,14		R\$ -	3.332,98	R\$ 33.263,14	-	R\$ -	100,00%			
4.5	43018	DER-ES (Rodovias)	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas	m	R\$ 54,50	R\$ 54.494,22	2.999,68	R\$ 163.482,67		R\$ -	2.999,68	R\$ 163.482,68	-	R\$ -	100,00%			
4.6	4011268	SICRO	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	m³	R\$ 62,97	R\$ 131.961,88	2.095,63	R\$ 131.961,88		R\$ -	2.095,63	R\$ 131.961,88	-	R\$ -	100,00%			
4.7	4011235	SICRO	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	m³	R\$ 62,89	R\$ 131.794,23	2.095,63	R\$ 131.794,23		R\$ -	2.095,63	R\$ 131.794,23	-	R\$ -	100,00%			
4.8		COMP-03	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.->08cm, sobre colchão de pó de pedra 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e pó de pedra, em Vias Urbanas	m²	R\$ 102,24	R\$ 1.071.286,51	10.478,15	R\$ 1.071.286,51		R\$ -	10.478,15	R\$ 1.071.286,50	-	R\$ -	100,00%			
4.9	41240	DER-ES (Rodovias)	Passo em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m)	m²	R\$ 81,26	R\$ 379.173,14	4.666,17	R\$ 379.173,14	910,99	R\$ 74.027,21	2.773,02	R\$ 225.335,77	1.893,15	R\$ 153.837,37	59,43%			
4.10	40658	DER-ES (Rodovias)	Caiação de meio fios, sarjetas, etc	m²	R\$ 2,61	R\$ 6.249,40	2.394,40	R\$ 6.249,40		R\$ -	-	R\$ -	2.394,40	R\$ 6.249,40	0,00%			
4.11	60010	DER-ES (Rodovias)	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (2,282XP + 3,043XR + 3,804) (XP=3,1km; XR=0,8km)	t	R\$ 4,19	R\$ 31.228,56	9.701,15	R\$ 40.647,82		R\$ -	9.701,15	R\$ 40.647,82	-	R\$ -	100,00%			
						SUB-TOTAL - 04	R\$ 1.862.603,74	R\$ 2.004.295,65		R\$ 74.027,21	-	R\$ 1.844.208,87	-	R\$ 160.086,77	92,01%			
05			MURO DE CONTENÇÃO															
5.1	010501	DER-ES (Edificações)	Locação de obra com gabarito de madeira	m²	R\$ 9,74	R\$ 727,38	74,68	R\$ 727,38		R\$ -	74,68	R\$ 727,38	-	R\$ -	100,00%			
5.2	030101	DER-ES (Edificações)	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m³	R\$ 19,07	R\$ 479,33	25,14	R\$ 479,33		R\$ -	25,14	R\$ 479,33	-	R\$ -	100,00%			
5.3	030201	DER-ES (Edificações)	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m³	R\$ 20,53	R\$ 2.710,04	132,00	R\$ 2.710,04		R\$ -	132,00	R\$ 2.710,04	-	R\$ -	100,00%			
5.4	040224	DER-ES (Edificações)	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	R\$ 692,97	R\$ 11.364,71	16,40	R\$ 11.364,71		R\$ -	16,40	R\$ 11.364,71	-	R\$ -	100,00%			
5.5	040231	DER-ES (Edificações)	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	R\$ 575,34	R\$ 13.149,40	22,86	R\$ 13.149,40		R\$ -	22,86	R\$ 13.149,40	-	R\$ -	100,00%			




Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100350039003300380037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										10ª MEDIÇÃO - PERÍODO 12/11/2025 à 11/12/2025								
CONTRATADA: GSF TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI																		
DATA BASE: OUTUBRO/2023 - TABELAS DER/ES;SICRO;SINAPI - VALOR LICITADO: R\$ 4.855.174,49 - VALOR CONTRATADO: R\$ 3.200.000,00 - COEFICIENTE DE DESCONTO: 0,65909 -																		
OBRA: Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação dos Loteamentos Monte Negro e Ernesto Silva pertencentes ao Município de João Neiva-ES										LS:	BDI:	23,32%	PRIMEIRO REPLANILHAMENTO		R\$ 103.942,68	R\$ 3.753.872,98	R\$ 216.515,09	94,547%
										CONTRATO + ADITIVO		10ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO		EXECUTADO
Item	Código	Órgão	DESCRIÇÃO SERVIÇO	Unid.	V. Unit.	V. Total	Quant.	V. Total	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO				
5.6	050502	DER-ES (Edificações)	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm	m²	R\$ 233,07	R\$ 26.108,50	112,02	R\$ 26.108,50		R\$ -	112,02	R\$ 26.108,50	-	R\$ -	100,00%			
5.7	040206	DER-ES (Edificações)	Fôrma de tábuas de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m²	R\$ 56,84	R\$ 11.865,35	208,75	R\$ 11.865,35		R\$ -	208,75	R\$ 11.865,35	-	R\$ -	100,00%			
5.8	040243	DER-ES (Edificações)	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	R\$ 13,97	R\$ 9.570,85	685,10	R\$ 9.570,85		R\$ -	685,10	R\$ 9.570,85	-	R\$ -	100,00%			
5.9	040246	DER-ES (Edificações)	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	R\$ 12,52	R\$ 3.240,18	258,80	R\$ 3.240,18		R\$ -	258,80	R\$ 3.240,18	-	R\$ -	100,00%			
5.10	102722	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊX TIL. AF_07/2021	m	R\$ 65,09	R\$ 2.430,46	37,34	R\$ 2.430,46		R\$ -	37,34	R\$ 2.430,46	-	R\$ -	100,00%			
5.11	100208	DER-ES (Edificações)	Índice de impermeabilização c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m²	R\$ 246,64	R\$ 43.644,18	176,96	R\$ 43.644,18		R\$ -	176,96	R\$ 43.644,18	-	R\$ -	100,00%			
5.12		COMP-05	Guarda corpo com corrimão - padrão PMJN, altura de 1,10 m corrimão fixado no guarda corpo à 0,80 m de altura, em tubo de aço carbono galvanizado Ø 2.1/2" e tubo quadrado (metalon) galvanizado 30 x 30 mm, inclusive pintura a duas demãos em esmalte sintético, fundo anticorrosivo - Aquisição, fabricação e assentamento.	m	R\$ 388,99	R\$ 14.524,89	37,34	R\$ 14.524,89	37,34	R\$ 14.524,89	37,34	R\$ 14.524,89	-	R\$ -	100,00%			
5.13	60010	DER-ES (Rodovias)	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (2,282XP + 3,043XR + 3,804) (XP=3,1km; XR=0,8km)	t	R\$ 4,19	R\$ 18,63	4,45	R\$ 18,63		R\$ -	4,45	R\$ 18,63	-	R\$ -	100,00%			
SUB-TOTAL - 05						R\$ 139.833,90		R\$ 139.833,90		R\$ 14.524,89		R\$ 139.833,90		R\$ -	100,00%			
06			ITENS NOVOS															
6.01	40567	DER-ES (Rodovias)	Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto	M	R\$ 94,62	R\$ -	1.666,49	R\$ 157.691,59		R\$ -	1.666,49	R\$ 157.691,60	-	R\$ -	100,00%			
6.02	41224	DER-ES (Rodovias)	Religação de rede de água em PVC DN 20mm, inclusive conexões	M	R\$ 22,65	R\$ -	1.666,49	R\$ 37.750,08		R\$ -	1.666,49	R\$ 37.750,09	-	R\$ -	100,00%			
6.03	40513	DER-ES (Rodovias)	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m	M	R\$ 106,14	R\$ -	1.220,85	R\$ 129.583,73		R\$ -	1.187,85	R\$ 126.081,04	33,00	R\$ 3.502,69	97,30%			
6.04	40514	DER-ES (Rodovias)	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m	M	R\$ 179,77	R\$ -	206,40	R\$ 37.105,12		R\$ -	180,28	R\$ 32.409,45	26,12	R\$ 4.695,67	87,34%			
6.05	60002	DER-ES (Rodovias)	TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - 1,287XP + 1,341XR + 5,365 (XP = 19,40 ; XR = 1,00)	T	R\$ 25,74	R\$ -	3.871,92	R\$ 99.679,22		R\$ -	3.871,92	R\$ 99.679,22	-	R\$ -	100,00%			
6.06	60004	DER-ES (Rodovias)	TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) - 1,268XP + 1,319XR (XP = 25,90 ; XR = 1,00)	T	R\$ 27,77	R\$ -	2.585,45	R\$ 71.785,28		R\$ -	2.585,45	R\$ 71.785,27	-	R\$ -	100,00%			
6.07	40894	DER-ES (Rodovias)	Meio fio (assentamento), inclusive caiação	M	R\$ 35,87	R\$ -	333,30	R\$ 11.954,87		R\$ -	333,30	R\$ 11.954,87	-	R\$ -	100,00%			
6.08	41173	DER-ES (Rodovias)	Berço em brita para BSTC diâm. = 0,30 m em Vias Urbanas	M	R\$ 24,27	R\$ -	274,81	R\$ 6.669,61		R\$ -	274,81	R\$ 6.669,61	-	R\$ -	100,00%			
SUB-TOTAL - 06						R\$ -		R\$ 552.219,50		R\$ -		R\$ 544.021,15		R\$ 8.198,36	98,52%			
TOTAL GERAL						R\$ 3.200.000,00	V. TOTAL	R\$ 3.970.388,03		R\$ 103.942,68	V. ACUM.	R\$ 3.753.872,98	SALDO	R\$ 216.515,09	94,55%			
							% ACRÉSC.	124,07%		3,25%	% ACUM.	117,31%	% SALDO	6,77%				




Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100350039003300380037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



NOTAS

- SUB-BASE COM MISTURA DE ARGILA 30%, PÓ DE PEDRA 30% E BRITA 40%.
- BASE DE SOLO BRITA 40% EM PESO
- PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO (35MPA) ESPESSURA 8 CM SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA 5 CM
- PASSEIO EM CONCRETO ACABAMENTO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL (L-> 40 CM)
- TRINCHEIRA DRENANTE EM CONCRETO ARMADO GRELHAS FOFO
- PARA OS PV'S QUE NÃO SÃO CONTEMPLADOS COM PERFIS, O MANILHAMENTO DEVE SEGUIR A INCLINAÇÃO DO TERENO
- COBRIMENTOS MÍNIMOS PARA AS TUBULAÇÕES: Ø20 = 0,30m, Ø30 = 0,45m , Ø 40 = 0,60m, Ø 60 = 0,90m, Ø 80 = 1,20m , Ø 100 = 1,50m

- 09ª MEDIÇÃO
- 10ª MEDIÇÃO

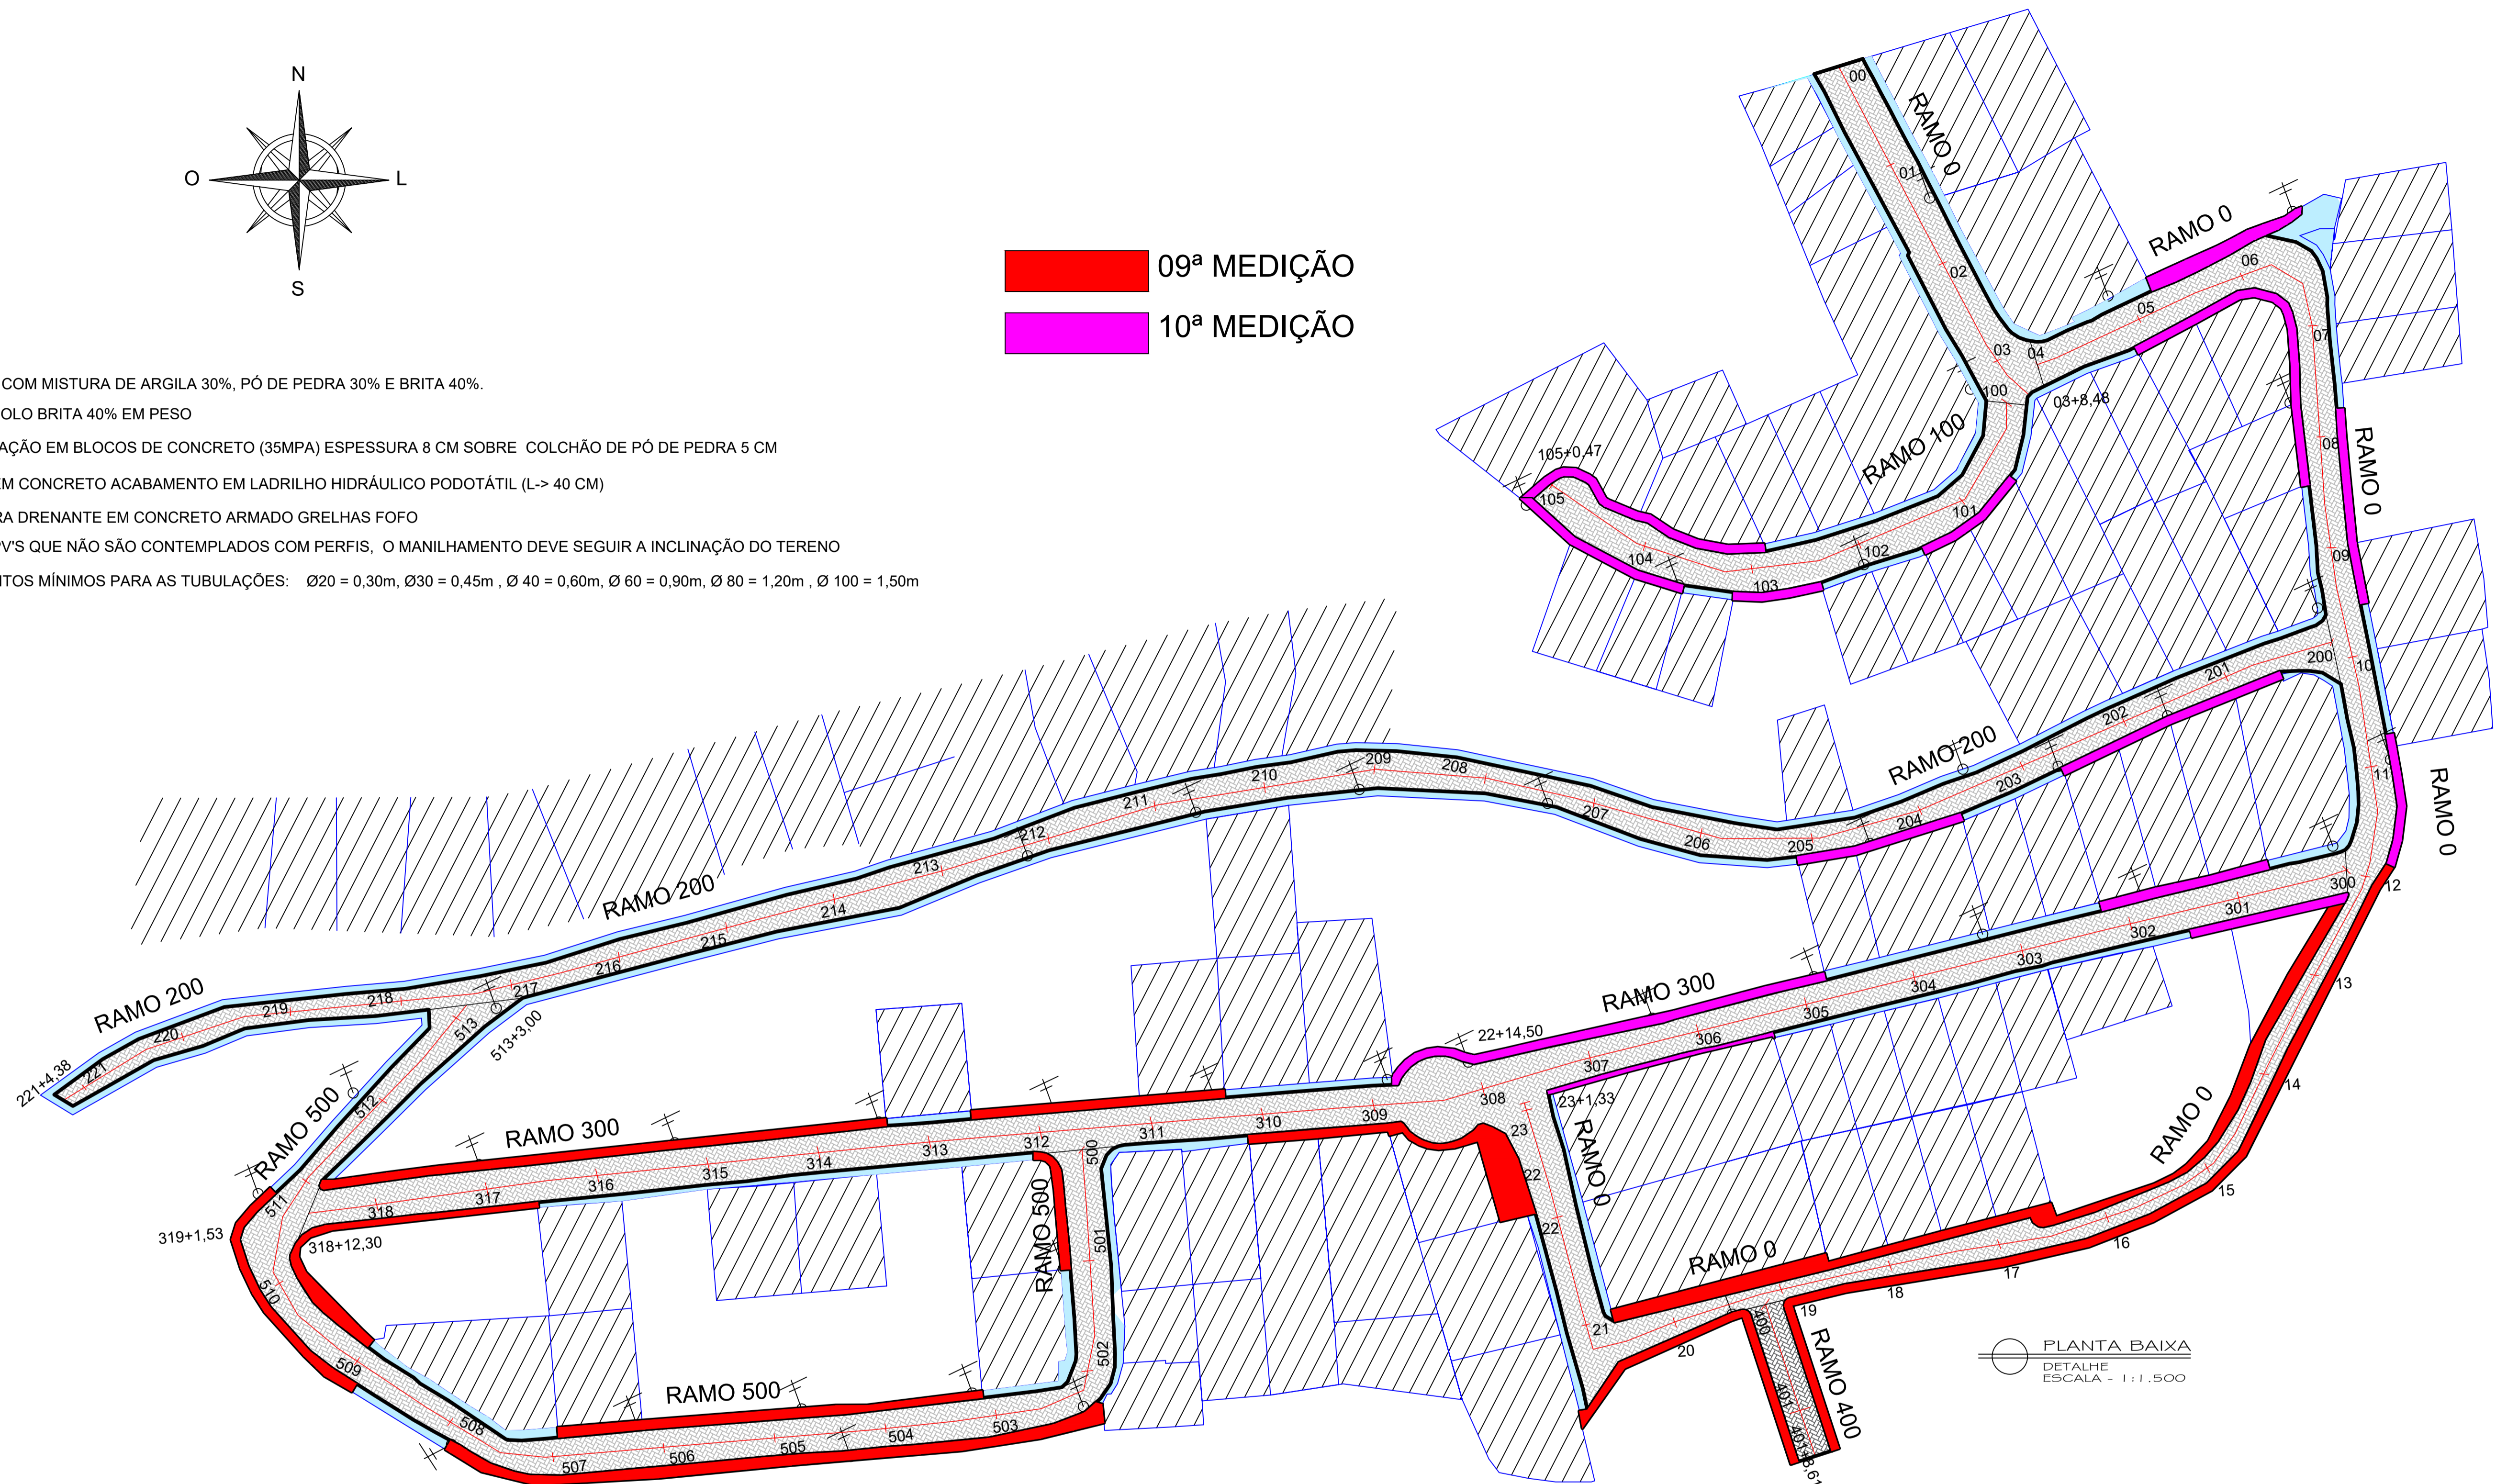

PLANTA BAIXA
DETALHE
ESCALA - 1:1.500

CONVENÇÕES

- | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|-------------------------|
| | EDIFICAÇÕES | | REDE DE DRENAGEM EXISTENTE | | POSTE |
| | CERCA | | TRINCHEIRA DRENANTE PROJETADA | | MEIO FIO EXISTENTE |
| | PAVIMENTAÇÃO PROJETADA | | CAIXA RALO PROJETADA | | MEIO FIO PROJETADO |
| | PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE | | PV PROJETADO | | BORDO ESTRADA EXISTENTE |
| | CALÇADA PROJETADA | | BOCA PROJETADA | | GUIA DE TRAVAMENTO |
| | RIO / CÓRREGO | | DISSIPADOR DE ENERGIA DEB-01 PROJETADO | | MURO DE ARRIMO |
| | REDE DE ESGOTO EXISTENTE | | DESCIDA D'ÁGUA DSA-03A PROJETADA | | MEIO FIO REBAIXADO |
| | CURVAS DE NÍVEL | | ÁRVORE | | CANTEIROS |

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	
CONSULTORIA:	COORDENADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Civil : JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA-ES 0047233/D
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	
PROJETO: PROJETO GEOMÉTRICO MEIO-FIO	REVISÃO: REV01 ESCALA: 1/1.500
END.: LOTEAMENTO MONTE NEGRO E ERNESTO SILVA, CENTRO, JOÃO NEIVA/ES	DATA: ABRIL/2025 FOLHA: 01/01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO - TEL: (27) 3258-4700 - FAX (27) 3258-4724
CEP: 29680-000 - JOAO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DADOS GERAIS

Contrato Nº 080/2024

Objeto: Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação dos Loteamentos Monte Negro e Ernesto Silva pertencentes ao Município de João Neiva-ES

Empresa: GSF Transportes, Locações e Serviços LTDA

Fiscal: Jefyson Silva Loureiro – CREA ES 0047233/D

FOTOS DOS SERVIÇOS

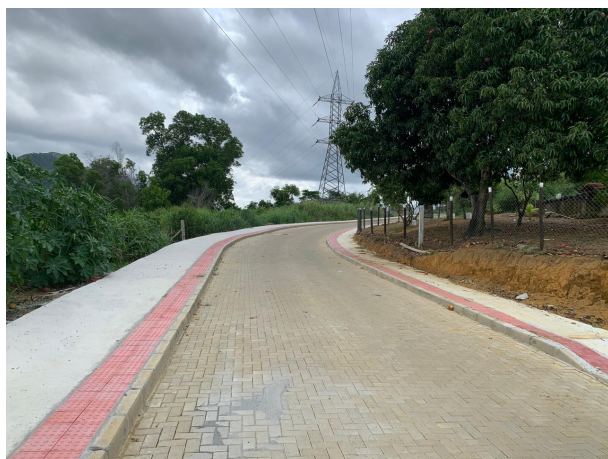


Foto 01:



Foto 02:



Foto 03:



Foto 04:





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO - TEL: (27) 3258-4700 - FAX (27) 3258-4724
CEP: 29680-000 - JOAO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86

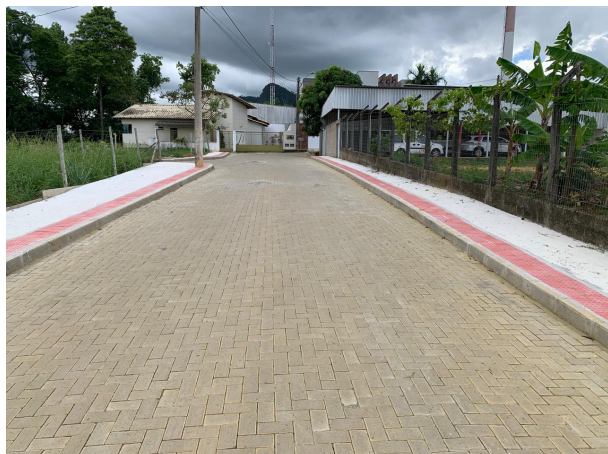


Foto 05:

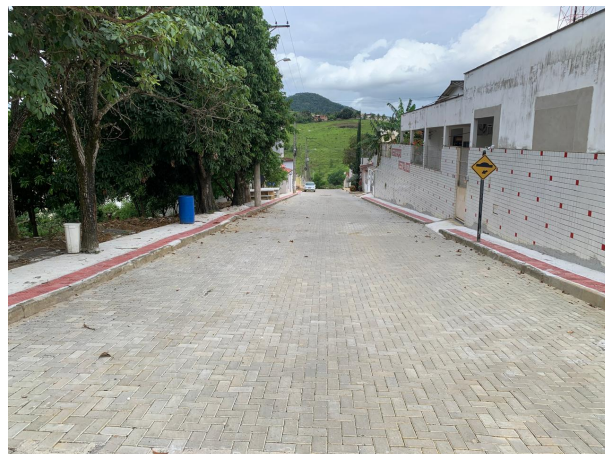


Foto 06:



Foto 07:

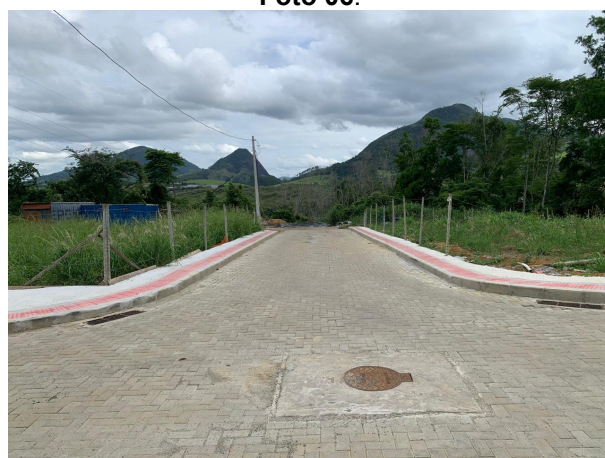


Foto 08:

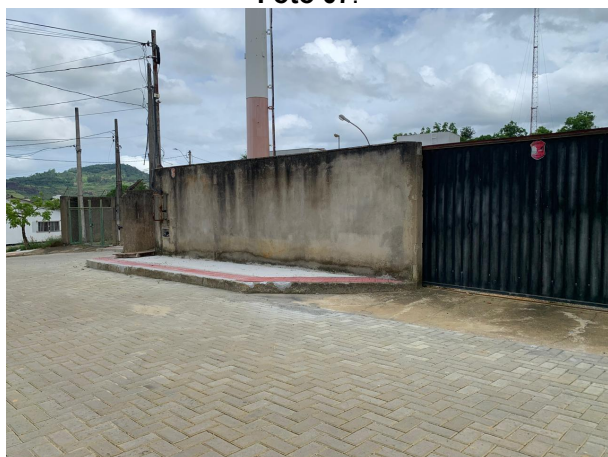


Foto 09:



Foto 10:





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO - TEL: (27) 3258-4700 - FAX (27) 3258-4724
CEP: 29680-000 - JOAO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86



Foto 11:

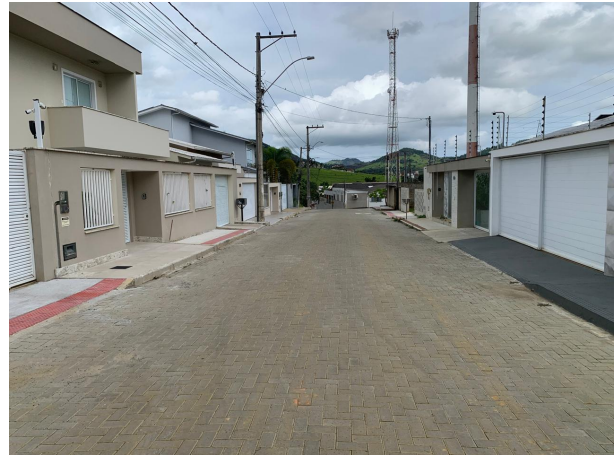


Foto 12:

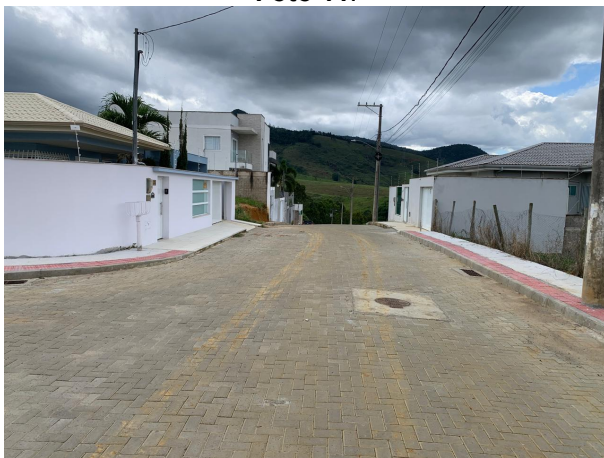


Foto 13:



Foto 14:



Foto 15:



Foto 16:





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO - TEL: (27) 3258-4700 - FAX (27) 3258-4724
CEP: 29680-000 - JOAO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86



Foto 17:



Foto 18:



Foto 19:



Foto 20:



Foto 21:

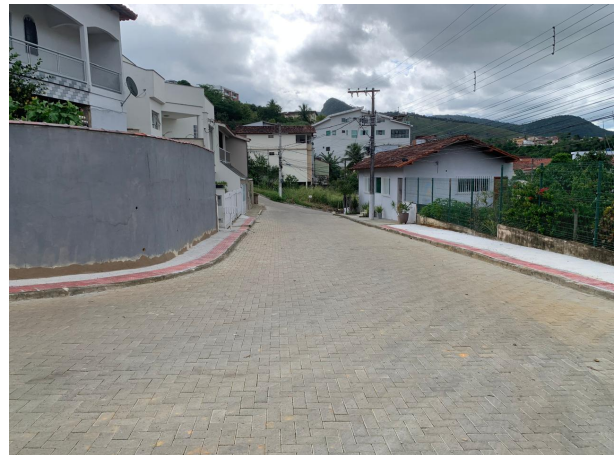


Foto 22:

João Neiva / ES, 12 de dezembro de 2025.

Atenciosamente,

JEFYSON SILVA LOUREIRO

Engenheiro Civil
Portaria nº 14.706/2025
CREA ES-0047233/D

